

« I LA TENE TI TO NA MBONGO – Tous ensemble pour le Sud-Est »

Programme de relèvement socioéconomique dans la zone Sud-Est de la République centrafricaine (RELSUDE)

SUIVI DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE BANGASSOU



République centrafricaine, mai 2021

CONDUIT PAR

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE

Sommaire

■ Liste des acronymes	3
■ Cadre d'action	6
■ Carte de la zone d'intervention	7
■ Méthodologie	8
■ Carte générale de Bangassou	9
■ Cartographie des acteurs	10
■ Diagnostic communautaire des services de base	13
■ Autoévaluation des Organisation de la société civile (OSC)	14
■ Tableau de suivi du PDL	15
Eau, hygiène et assainissement	16
Infrastructures	20
Santé	21
Éducation	23
Commerce	27
Activités agro-pastorales	31
Gouvernance, justice et cohésion sociale	38

Liste des acronymes

ACDA	Agence centrafricaine de développement agricole
ACF	Action contre la faim
ACTED	Agence d'aide à la coopération technique et au développement
ADDC	Action pour le développement durable en Centrafrique
AEDD	Agence pour l'environnement et le développement durable
AFI	Alphabétisation fonctionnelle intensive
AGR	Activité génératrice de revenu
AHD	Association des humanitaires pour le développement
ANDE	Agence nationale pour le développement de l'élevage
ANEA	Agence nationale de l'eau et de l'assainissement
ASA	Afrique secours et assistance
CCCM	Gestion et Coordination des sites de déplacement
COGES	Comité de gestion
COHEB	<i>Community Humanitarian Emergency Board</i>
COOPI	<i>Cooperazione Internazionale</i>
COOPIADAA	Coopérative interafricaine et de développement agroalimentaire
CORDAID	<i>Catholic Organisation for Relief and Development Aid</i>
CPC	Coalition des patriotes pour le changement
CRCA	Croix Rouge centrafricaine
CRS	<i>Catholic Relief Service</i>
DR	Direction régionale
DRC	<i>Danish Refugee Council</i>
ECAC	Enseignement catholique associé de Centrafrique
EHA	Eau, hygiène et assainissement
ESF	Enfants sans frontières
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FICR	Fédération internationale des Sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Liste des acronymes (suite)

FPU	<i>Free Press Unlimited</i>
HI	Humanité & Inclusion
IC	<i>Invisible Children</i>
IDEACA	Initiative de développement de l'élevage et agriculture en Centrafrique
IEDA Relief	<i>International Emergency and Development Aid</i>
JUPEDEC	Jeunesse unie pour la protection de l'environnement et le développement communautaire
MAHRN	Ministère de l'Action humanitaire et de la réconciliation nationale
MATD	Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation
MDA	Médecins d'Afrique
MINUSCA	Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine
MSF	Médecins sans frontières
MVAD	Mutualité des volontaires africains pour le développement en Centrafrique
NFI	Article non-alimentaire
OCHA	Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires
OFCA	Organisation des femmes de Centrafrique
OIM	Organisation mondiale pour les migrations
OMS	Organisation mondiale de la Santé
ONG	Organisation non gouvernementale
OSC	Organisation de la société civile
PACAD	Projet d'appui aux communautés affectées par le déplacement
PAM	Programme alimentaire mondial
PDL	Plan de développement local
PK	Point kilométrique
PRL	Plan de relèvement local
PUI	Première urgence internationale
RCA	République centrafricaine
RELSUDE	Relèvement du Sud-Est

Liste des acronymes (suite)

RMCC	Réseau des médias communautaires en Centrafrique
SMART	Simple, mesurable, acceptable, réalisable et temporel
UNHCR	Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance
UNOPS	Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets
VD	Vision et développement
WALT	<i>Women Act for Living Together</i>
XAF	Franc CFA de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC)

Cadre d'action

CONTEXTE

La crise politique et militaire de 2012-2014 en République centrafricaine (RCA) et ses conséquences ont particulièrement affecté les préfectures du Sud-Est de la RCA, à savoir la Basse-Kotto, le Haut-Mbomou, la Haute-Kotto, le Mbomou et la Ouaka. Ces dernières enregistrent encore à ce jour les besoins les plus aigus en termes d'accès à l'eau, à la santé, aux moyens de subsistance et à la protection¹.

Plusieurs facteurs contribuent à la vulnérabilité socio-économique du Sud-Est : préfectures les moins densément peuplées, elles sont également les moins bien connectées au reste du pays, avec un Etat historiquement moins présent, accentuant l'influence des groupes armés (GA). Ajouté à cela, les faibles ressources et compétences techniques au niveau communal et préfectoral freinent les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'Etat dans l'exercice de leurs missions².

La relative stabilisation sécuritaire dans les chefs-lieux des sous-préfectures et les perspectives ouvertes par la signature de l'accord politique de paix et de réconciliation entre l'Etat et plusieurs groupes armés en février 2019 permettent d'envisager des réponses simultanées aux besoins humanitaires urgents et des actions de relèvement à plus long terme. En ce sens, le gouvernement a déjà engagé un effort de redéploiement des services publics dans les régions, ce qui laisse envisager un renforcement parallèle des services sociocommunautaires existants et des structures de gouvernance locale³.

Afin de soutenir ce processus, les organisations non gouvernementales (ONG) ACTED, OXFAM, COOPI, CONCERN, *Free Press Unlimited* (FPU) et IMPACT Initiatives, à travers AGORA, se sont réunies en consortium dans le cadre du projet RELSUDE, afin de répondre aux difficultés présentées ci-dessus et renforcer de manière holistique les capacités de résilience des communautés dans 21 chefs-lieux de préfecture ou chefs-lieux de sous-préfecture dans la zone du Sud-Est (voir carte p. 7). L'objectif du projet RELSUDE est à la fois de répondre aux besoins de base des populations, de renforcer les capacités de relèvement socio-économiques des communautés, et d'accompagner la consolidation du rôle des autorités locales.

OBJECTIFS DU DOCUMENT

Dans le cadre du projet RELSUDE, l'initiative AGORA a pour objectif la réalisation de Plans de relèvement local (PRL), sur la base d'une analyse multisectorielle des besoins et d'une planification participative. Or, pour la commune de Bangassou, un Plan de développement local (PDL) a déjà été élaboré en 2019 dans le cadre du Projet d'appui aux communautés affectées par le déplacement (PACAD), initié par le gouvernement de la RCA à travers le ministère de l'Action humanitaire et de la réconciliation nationale (MAHRN), avec l'appui de la Banque mondiale. La mise en œuvre a été confiée au Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS). La version définitive a été rendue publique en décembre 2019.

S'appuyant sur un ensemble d'outils de diagnostic et de planification, il propose une vision du développement de la ville de Bangassou en 3 phases chronologiques : 2020-2023, 2024-2026 et 2027-2030.


S'étant fixé pour objectif, dans la mesure du possible, de s'appuyer sur les documents de planification existants, AGORA propose dans le présent document à la fois un bilan d'étape et un outil de suivi de la réalisation des objectifs du PDL de Bangassou sur la période 2020-2023.

¹ Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), [Aperçu des besoins humanitaires, 2021](#) – République centrafricaine.

² Banque mondiale, [Enquête nationale sur les monographies communales 2016](#) - République centrafricaine, 2017.

³ Finance For Impact, [Redéploiement de l'action publique en Centrafrique, étude de préfiguration d'un futur programme de gouvernance en Centrafrique](#), 2019.

Carte des localités couvertes par le projet RELSUDE

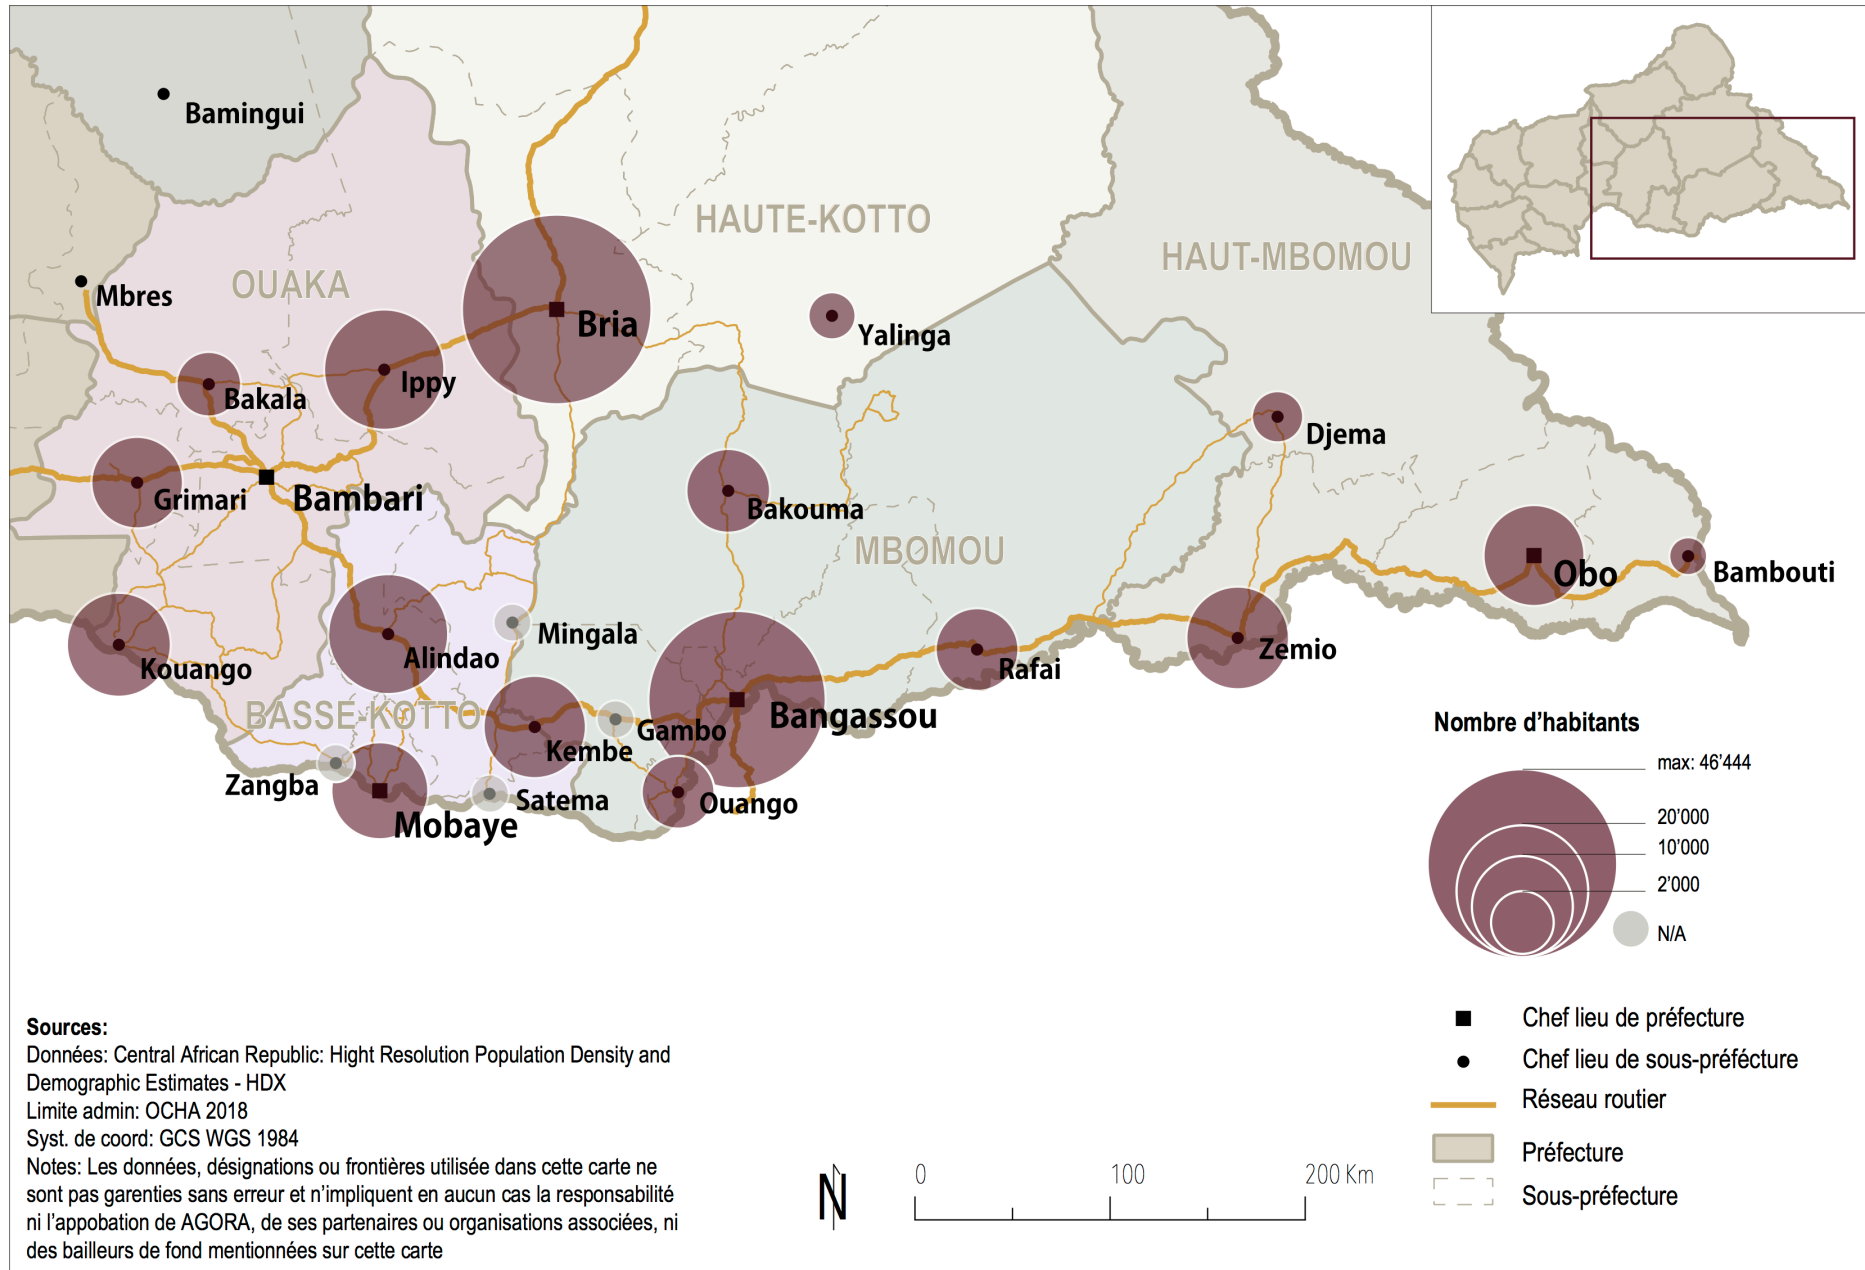

Méthodologie

Les données ayant permis l'élaboration du présent document ont été collectées entre le 18 mars et le 1er avril 2021. L'équipe AGORA a mené des groupes de discussion communautaires dans chacun des trois arrondissements de Bangassou, réalisé une vingtaine d'entretiens individuels et organisé un atelier de travail participatif avec les autorités locales et les partenaires de l'aide. Un atelier a également été organisé avec les organisations de la société civile (OSC).

Le travail s'est articulé autour de trois objectifs :

1. Localiser et actualiser les besoins relatifs aux infrastructures et services essentiels :

- Groupes de discussion avec la communauté ;
- Cartographie des services essentiels.

2. Opérationnaliser les objectifs prévus dans le PDL :

- Atelier de travail participatif

3. Appuyer les instances locales dans le suivi et la mise en application du PDL :

- Atelier de travail participatif ;
- Diagnostics des besoins en renforcement de capacités des acteurs institutionnels ;
- Autoévaluation des capacités des OSC.

Entretiens avec les acteurs locaux

Les données ont été collectées par l'équipe AGORA grâce à des entretiens semi-directifs individuels avec des informateurs clés, majoritairement des autorités locales et des acteurs de l'aide.

Groupes de discussion avec les membres de la communauté

Ces groupes de discussion sont menés avec 6 à 8 membres de la communauté et suivent un canevas semi-directif ayant pour objectif de faire émerger un diagnostic communautaire des services de base.

Deux groupes de discussion ont été organisés dans chacun des trois arrondissements de Bangassou. Une désagrégation selon le genre a été effectuée, quand cela a été possible.

Les termes de références complets sont disponibles [au lien suivant](#) et les termes de références complets de la méthodologie AGORA sont disponibles [ici](#).

Diagnostic des capacités des acteurs institutionnels

Ces entretiens semi-directifs, avec les acteurs institutionnels (notamment des représentants des services techniques déconcentrés et des services municipaux) permettent de dresser un bilan de leurs missions, d'analyser leur niveau de compréhension de leurs rôles et responsabilités, d'évaluer leurs besoins de renforcement techniques et organisationnels au regard de leurs mandats.

Diagnostic des capacités des OSC

Dans chacune des 21 localités ciblées, les équipes AGORA ont utilisé une version allégée de l'outil *Taking the Lead* développé par OXFAM. Dans le cadre de RELSUDE, *Taking the Lead* consiste en l'autodiagnostic par les OSC de leurs capacités. (voir p. 14)


Atelier de suivi du PDL de Bangassou

L'objectif de cet atelier était de conduire un exercice participatif avec les autorités locales et les partenaires de l'aide afin de :

- Faire un bilan des actions ayant répondu totalement ou partiellement aux orientations du PDL ;
- Actualiser ou affiner certaines orientations ;
- Discuter des projets en cours ou à venir, en lien avec les orientations du PDL ;
- Réfléchir à la façon de coordonner la réponse au PDL entre tous les acteurs : autorités locales, leaders communautaires, communauté, acteurs économiques, acteurs de l'aide ;
- Revitaliser et appuyer le comité technique de suivi du PDL pour assurer le suivi des futures actions en lien avec le développement local.

Pour ce faire, chacune des 62 orientations proposées par le PDL a fait l'objet d'échanges entre les participants. Les données présentées ci-après sont le compte-rendu de ces discussions. En tant que tel, elles ne prétendent pas à l'exhaustivité et forment davantage une base de travail sur laquelle les acteurs du développement de Bangassou peuvent s'appuyer et qu'ils pourront enrichir.

Carte générale du centre-ville de Bangassou

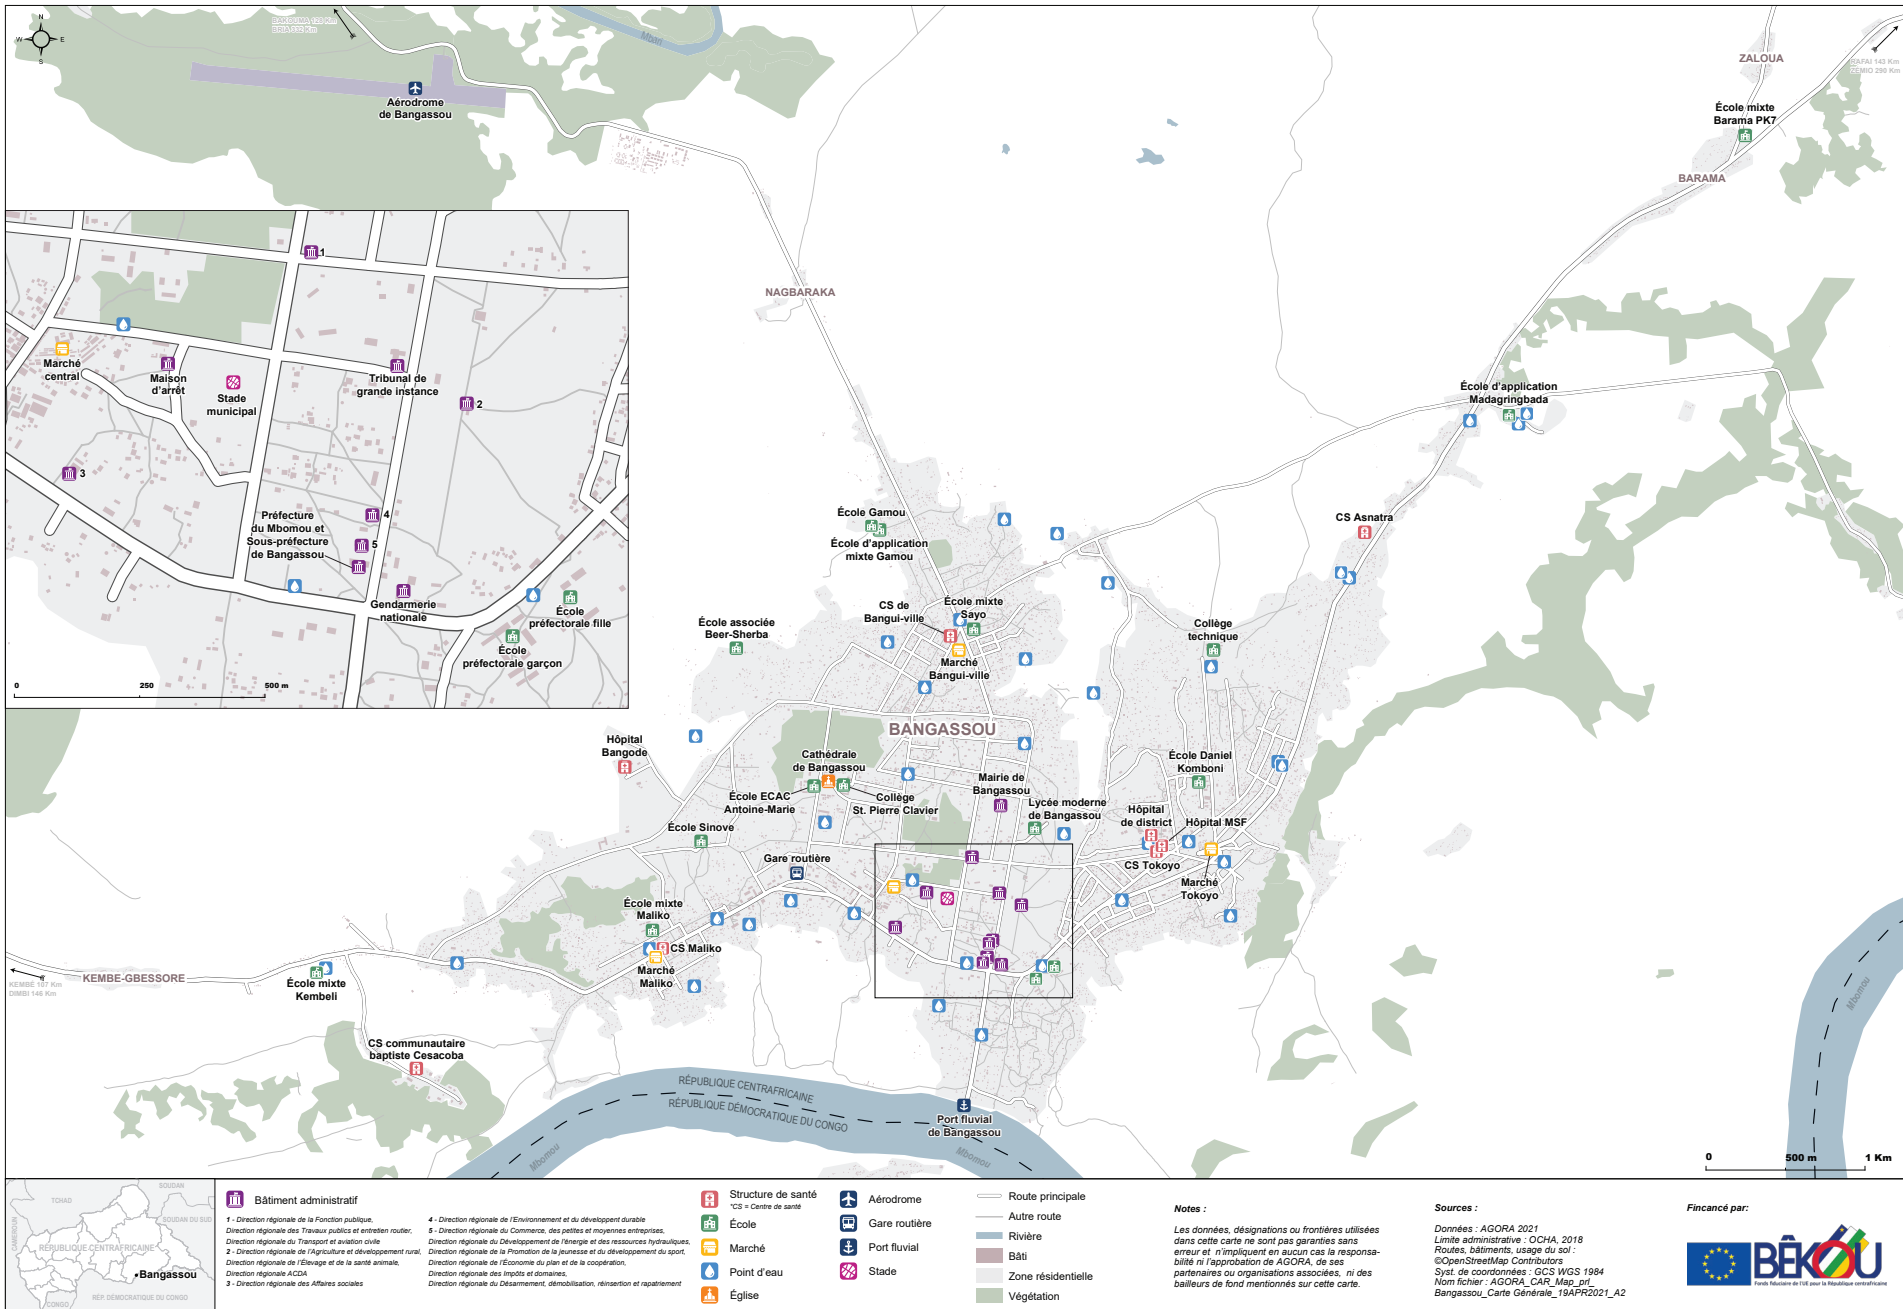

Cartographie des acteurs

Selon les informateurs clés rencontrés, les événements violents de janvier 2021 survenus à Bangassou, dus aux affrontements entre groupes armés et forces armées centrafricaines (FACA), ont participé à désorganiser les services de l'Etat sur place⁴. Ils ont notamment provoqué le départ d'un certain nombre de représentants de services techniques déconcentrés et retardé l'arrivée de personnels affectés. Fin mars 2021, les informateurs

clés ont rapporté que 9 directeurs ou directrices régionaux sur 19 recensé.e.s n'étaient pas présent.e.s sur place (voir Tableau 1).

Par ailleurs, Bangassou concentre une forte présence des acteurs de l'aide (voir Tableau 2). La coordination de ces acteurs est assurée par un bureau de représentation d'OCHA.

Tableau 1 : Cartographie des acteurs institutionnels, techniques et communautaires liés au PDL

Acteurs institutionnels et techniques	Présence à Bangassou au 31 mars 2021	Membre du Comité technique de suivi du PDL
Préfet	Présente	
Secrétaire général de la Préfecture	Présent	
Sous-préfet	Présent	
Secrétaire général de la Sous-préfecture	Présent	
Maire	Présent	
Secrétaire général de la Mairie	Présent	x
Maire du 1 ^{er} arrondissement	Présent	
Maire du 2 ^e arrondissement	Présent	
Maire du 3 ^e arrondissement	Présent	
Directeur régional n°6 de l'Economie, du Plan et de la coopération	Présent	x (coordinateur)
Directeur régional n°6 des Impôts et domaine	Absent	
Directeur régional n°6 des Eaux, forêts, chasse et pêche	Absent	
Directeur régional n°6 du Travail, de l'emploi et de la protection sociale	Absent	
Directeur régional n°6 de la Fonction publique	Présent	
Directeur régional n°6 des Affaires sociales	Présent	x
Directeur régional n°6 des Travaux publics et de l'entretien routier	Présent	x

⁴ A la mi-décembre 2020, six groupes armés ont formé une alliance, la « Coalition des patriotes pour le changement » (CPC) et lancé des offensives simultanées dans plusieurs villes de la RCA contre les forces de sécurité nationales et internationales. Des villes importantes comme Bambari, Bangassou, Bouar, ou encore Bossembélé et Damara ont été particulièrement ciblées.

Cartographie des acteurs (suite)

Acteurs institutionnels et techniques	Présence à Bangassou au 31 mars 2021	Membre du Comité technique de suivi du PDL
Directeur régional n°6 de la Santé et de la Population	Présent	x
Directeur régional n°6 du Commerce, des petites et moyennes entreprises	Absent	x
Directrice régionale n°6 du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques	Présente	x
Chef d'antenne de l'Agence nationale de l'eau et de l'assainissement (ANEA)	Présent	
Directeur régional n°6 de l'Urbanisme, de la ville et de l'habitat	Présent	
Directeur régional n°6 de l'Elevage et de la santé animale	Présent	
Directeur régional n°6 de l'Agriculture et du développement rural	Présent	x
Directeur régional n°6 de l'Agence centrafricaine de développement agricole (ACDA)	Présent	x
Directeur régional n°6 de l'Environnement et du développement durable	Présent	
Directeur régional n°6 des Arts, de la culture et du tourisme	Absent	
Directeur régional n°6 du Trésor	Absent	
Directeur régional n°6 du Désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement	Absent	
Directeur régional n°6 des Mines et de la géologie	Pas d'information	
Inspecteur académique du Sud-Est	Présent	x
Inspecteur de la Jeunesse et du développement du sport	Absent	
Représentante de l' Organisation des femmes de Centrafrique (OFCA)	Présente	x
Président du Conseil national de la Jeunesse de Bangassou	Présent	x
Imam de Bangassou	Présent	x
Abbé de la paroisse de Tokoyo	Présent	x

Cartographie des acteurs (suite)

Tableau 2 : Présence opérationnelle des acteurs de l'aide à Bangassou⁵

Secteurs d'intervention	ONG internationales	ONG nationales	Organisations multilatérales
Abris et Articles non-alimentaires (NFI)	ACTED, CRCA		UNHCR, OIM
Gestion et Coordination des sites de déplacement (CCCM)	ASA	JUPEDEC	UNHCR, OIM
Education	COOPI	AHD, CARITAS Centrafrique, ESF, WALT	UNICEF
Eau, hygiène et assainissement (EHA)	ACF, ACTED, CRS, MSF Belgique, OXFAM	ADDC, CARITAS Centrafrique	UNICEF
Logistique	ACTED, PUI		PAM
Nutrition	MDA, MSF Belgique, MVAD, PAM, UNICEF		PAM, UNICEF
Protection	ASA, CRCA, DRC, IC, OXFAM	JUPEDEC, VD	UNHCR, OIM, UNICEF
Santé	ACTED, CORDAID, CRCA, FICR, MDA, MSF Belgique, MVAD		OMS

⁵ OCHA, [3W Présence opérationnelle zone Sud-Est](#), janvier 2021.

Diagnostic communautaire des services de base

EAU, HYGIÈNE, ASSAINISSEMENT

Les participants aux groupes de discussion ont tous souligné l'insuffisance du nombre de points d'eau au centre-ville de Bangassou. Cela se traduit par des temps d'attente et de marche élevés. Ces problèmes toucheraient l'ensemble de la population et plus particulièrement les femmes et les personnes déplacées. Les participants ont également souligné le manque de latrines communautaires. Certains se plaignaient également du niveau dégradé de salubrité de la ville.

3 PRIORITÉS

- Construire de nouveaux points d'eau
- Construire des latrines communautaires
- Mettre en œuvre des activités d'assainissement dans la ville (désherbage, nettoyage, etc.)

BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES

Recruter des ouvriers localement, par arrondissement, dans le cadre d'une procédure transparente et équitable.

Former des agents réparateurs.

S'assurer que les dotations sont gérées de manière sûre et transparente.

ÉDUCATION

Les participants aux groupes de discussion ont identifié le manque d'enseignants qualifiés comme la principale barrière d'accès à l'éducation. Viennent ensuite le manque de bâtiments scolaires, ou leur mauvais état, ainsi que le manque de matériel didactique (table-banc, cahier, stylo). Certains ont regretté l'absence de salaire pour les enseignants contractuels. L'éducation apparaît comme l'un des secteurs prioritaires d'intervention pour la communauté avec la santé.

3 PRIORITÉS

- Construire de nouveaux bâtiments scolaires
- Appuyer l'affectation d'enseignants qualifiés et renforcer les capacités des enseignants en poste
- Dotation de fournitures scolaires

BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES

Assurer un suivi des activités mises en œuvre.

S'assurer que les dotations sont gérées de manière sûre, équitable et transparente.

SANTÉ

La qualité de l'accueil (lenteur, manque de place) et des soins (manque de médecins qualifiés) semble être un sujet de préoccupation pour les participants aux groupes de discussion. Le prix des consultations et des médicaments est jugé trop élevé. L'insuffisance du nombre de formations sanitaires (FOSA) a également été soulignée. La santé apparaît comme l'un des secteurs prioritaires d'intervention pour la communauté avec l'éducation.

3 PRIORITÉS

- Appuyer l'affectation de personnel qualifié et renforcer les capacités du personnel en place ;
- Dotation de médicaments, produits pharmaceutiques et matériel médical ;
- Réhabilitation et construction d'infrastructures sanitaires.

BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES

S'assurer qu'il n'existe aucune discrimination dans l'accueil et la prise en charge des patients.

S'assurer que les dotations sont gérées de manière sûre, équitable et transparente.

MARCHÉ

Selon les participants aux groupes de discussion, il y aurait un manque d'espace sur les marchés. Cela conduirait notamment à des problèmes de salubrité, renforcés par le manque de latrines. Le prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité est jugé trop élevé. Certains ont également souligné un manque d'argent liquide (notamment de monnaie). Les taxes abusives appliquées par des membres des groupes armés ont également été citées comme barrière d'accès pour les commerçants.

3 PRIORITÉS

- Améliorer les infrastructures commerciales (construction d'étales, de latrines, d'espaces de stockage) ;
- Réhabilitation des infrastructures routières ;
- Mettre en place une structure de microfinance.

BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES

S'assurer du respect des objectifs et des échéances des projets.

Recruter des ouvriers localement, par arrondissement, dans le cadre d'une procédure transparente et équitable.

Inclure les services techniques déconcentrés de l'Etat dans les activités.

Autoévaluation des organisations de la société civile (OSC)

Les équipes AGORA ont utilisé une version adaptée et allégée de l'outil *Taking the Lead* développé par OXFAM, dans chacune des 21 localités ciblées. Dans le cadre de RELSUDE, *Taking the Lead* consiste en l'autodiagnostic des capacités des OSC. Les OSC sont identifiées à travers un appel à manifestation d'intérêt. Puis, sur la base d'une grille de critères élaborée avec OXFAM, entre 5 et 10 organisations sont conviées à un atelier pour autoévaluer leurs capacités techniques et organisationnelles, en tant qu'acteur de la ville. La méthodologie adoptée consiste en des groupes de discussion conduits par des animateurs sur la base d'un guide. La liste des critères comprend des aspects administratifs (statut officiel et règlement intérieur), techniques (domaines et approches d'intervention) et qualitatifs (perception de l'Organisation sur ses actions et impacts au niveau local). **L'analyse ci-dessous a été réalisée par OXFAM** sur la base des données collectées par AGORA auprès des OSC.



Capacité organisationnelle et structurelle

La faiblesse des OSC de la ville de Bangassou en matière d'organisation et de structuration associative constitue un obstacle majeur dans la mise en œuvre de leur mandat. En effet, ces OSC ne disposent pas d'une culture managériale permettant le déploiement d'un plan d'action stratégique pluriannuel, d'une politique de gestion des ressources humaines et d'un espace de coordination regroupant l'ensemble des acteurs du relèvement local. Plusieurs OSC de la localité de Bangassou fonctionnent en autarcie et n'ont pas encore bien identifié leurs rôles et responsabilités dans le processus du relèvement local. Cependant, l'ensemble des acteurs de ces OSC fait preuve de volontarisme dans l'exercice de leur mission. Par ailleurs, nous observons au sein des OSC de la ville de Bangassou une forte demande en matière de renforcement des capacités organisationnelles et structurelles.

Capacité d'intervention

Les interventions menées par les OSC de la ville de Bangassou sont en adéquation avec les problématiques humanitaires locales, mais force est de constater que les capacités opérationnelles de ces OSC sont très limitées au regard des besoins exprimés par la population. En effet, les OSC de la ville de Bangassou mobilisent difficilement les ressources financières et matérielles nécessaires à la réalisation de leurs programmes. De plus, le processus de gestion opérationnelle au sein des OSC ne prend pas en compte la formalisation de plan d'action opérationnel. Ce plan devrait aussi intégrer un mécanisme de suivi-évaluation contenant des indicateurs : simple, mesurable, acceptable, réalisable et temporel (SMART). Enfin, les OSC devraient définir une stratégie d'intervention incluant les enjeux du relèvement de la localité de Bangassou.

Redevabilité, autonomisation et participation citoyenne

On note à Bangassou la mise en place par les OSC de nombreuses initiatives en faveur de l'autonomisation des communautés et de la participation citoyenne. Cependant, il

ressort de l'analyse que les OSC de la localité de Bangassou devraient mettre un accent sur le déploiement de dispositifs en matière de redevabilité envers l'ensemble des acteurs du relèvement local. Aussi, ces OSC doivent jouer le rôle de contre-pouvoirs et de force de propositions dans un contexte politico-administratif difficile comme celui de Bangassou.

Besoin d'appui et d'accompagnement des OSC

Le relèvement de la localité de Bangassou passe entre autre par le renforcement des OSC sur les axes stratégiques, managériaux et opérationnels.

Axes prioritaires :

- Appui organisationnel et structurel : mise en place d'un système de management de la qualité, identification des rôles et responsabilités dans le processus du relèvement local, de sphère d'influence et parties prenantes, analyse des enjeux stratégiques ;
- Gouvernance associative : planification stratégique, gestion financière, gestion de projet, gestion des ressources humaines, principes de transparence ;
- Gestion opérationnelle : planification opérationnelle, indicateurs SMART, suivi-évaluation, monitoring, principes et normes humanitaires (approche, méthodes, outils), participation citoyenne et redevabilité (approche, méthodes, outils).

Axes secondaires :

- Développement local (approche, méthodes, outils) ;
- Recherche de financement ;
- Communication institutionnelle ;
- Réseautage et développement de partenariat ;
- Logistique.

Tableau de suivi du PDL

Ce tableau de suivi est issu de l'atelier de travail organisé le 31 mars 2021 qui a réuni, en présence du sous-préfet, des autorités locales, des représentants des services techniques déconcentrés et des représentants des acteurs de l'aide.




Il reflète la teneur des débats et a pu être enrichi sur certains points grâce à des entretiens avec des informateurs clés. Il n'a pas la vocation à être entièrement exhaustif et AGORA encourage les acteurs impliqués dans le suivi du PDL à l'amender, l'améliorer et d'en faire un outil pérenne.

Améliorer l'accès des populations à l'eau potable

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	INSTITUTIONS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Sensibilisation sur l'entretien des ouvrages hydrauliques.</p> <p>Quantité</p> <p>3 séances par arrondissement.</p>	<p>OXFAM : 7 séances de sensibilisation réalisées.</p> <p>Mercy Corps : Distribution de savon à Siwa avec 529 ménages.</p>	<p>Mercy Corps : Promotion de l'hygiène, dans les zones d'intervention y compris Bangassou centre.</p> <p>CORDAID : Sensibilisation et distribution de kits d'hygiène (à Bangassou, Rafaï, Bakouma, Gambo et Ouango).</p>	<p>Chef d'antenne ANEA</p> <p>Directrice régionale (DR) Energie et hydraulique</p>
OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Construction de 15 forages mécanisés par arrondissement.</p> <p>Quantité</p> <p>15 forages par arrondissement.</p>	<p>UNOPS : Activités en cours : 4 forages réalisés, à équiper.</p> <p>OXFAM (RELSUDE) : 2 forages réalisés.</p>	<p>UNOPS : 50 forages prévus.</p> <p>OXFAM (RELSUDE) : 10 sites de construction identifiés.</p> <p>CORDAID : Activités en cours (forage et adduction d'eau, à Bangassou et Ouango).</p>	<p>Chef d'antenne ANEA</p> <p>DR Energie et hydraulique</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Les activités de UNOPS ont été suspendues par manque de matériaux, dont l'approvisionnement a été rendu difficile avec la crise.</p> <p>Selon la DR Energie et hydraulique, il existerait un nouveau besoin en EHA au site de Siwa à PK 13 sur l'axe fleuve (réhabilitation/aménagement de points d'eau).</p> <p>Mercy Corps a prévu de réhabiliter 6 points d'eau dans les environs de Bangassou, à Zakobela, Lougoumba, Niakari, Nabarka, axe fleuve et une source à Siwa d'ici à fin novembre 2021.</p>			



Améliorer l'accès des populations à l'eau potable (suite)

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Construction et équipement d'un magasin de pièces de rechange pour les ouvrages hydrauliques.</p> <p>Quantité</p> <p>1 magasin de 200 m²</p>	<p>Aucune réponse à ce jour.</p> 	<p>Aucun projet planifié.</p> 	<p>Chef d'antenne ANEA</p> <p>DR Energie et hydraulique</p>
<p>Projet</p> <p>Programme de formation des artisans réparateurs par commune (au moins 5 artisans par commune).</p> <p>Quantité</p> <p>3 séances par arr.</p>	<p>OXFAM (RELSUDE) : 7 artisans réparateurs identifiés et formés.</p>	<p>OXFAM (RELSUDE) : 2 formations prévues.</p> <p>CORDAID : Formation de 10 artisans réparateurs à Bangassou, Rafaï et Ouango.</p>	<p>Chef d'antenne ANEA</p> <p>DR Energie et hydraulique</p>
<p>Projet</p> <p>Mise en place et formation d'un comité de gestion des points d'eau par arrondissement.</p> <p>Quantité</p> <p>2 séances par arr.</p>	<p>OXFAM (RELSUDE) : Mise en place et formation de 7 comités de gestion des points d'eau.</p> <p>CORDAID : Mise en place de comités de gestion des points d'eau.</p>	<p>Aucun projet planifié à Bangassou centre.</p> 	<p>Chef d'antenne ANEA</p> <p>DR Energie et hydraulique</p>






Améliorer l'hygiène et l'assainissement

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Construction de deux blocs de 4 latrines dans les marchés, écoles et centres de santé.</p> <p>Quantité</p> <p>14 écoles, 5 collèges et 3 centres de santé et 3 marchés.</p>	<p>OXFAM :</p> <p>Réponse en cours.</p>	<p>CORDAID :</p> <p>Construction de 3 blocs de latrines en centre-ville.</p>	<p>Mairie</p> <p>Inspection académique du Sud-Est</p> <p>Direction régionale de la Santé</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Pas de nouvelles latrines dans le 2^e arrondissement à ce jour.</p>			
OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Appui aux ménages pour la construction de latrines dans les maisons d'habitation.</p> <p>Quantité</p> <p>20 par arrondissement.</p>	<p>OXFAM :</p> <p>Appui des ménages à Tokoyo (3^e arrondissement) pour la construction de plus de 20 latrines.</p>	<p>OXFAM :</p> <p>Appui des ménages pour la construction de latrines dans les deux autres arrondissements.</p>	<p>Mairie</p>






Améliorer l'hygiène et l'assainissement (suite)

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Distribution de 1000 kits de lavage de mains dans les écoles.</p>	<p>Partenaire non-connu : Distribution de kits de lavage de mains.</p>		<p>Inspection académique du Sud-Est</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Des kits de lavage de main ont été distribués mais ont disparu ou été dispersés pendant la crise de janvier 2021. Aucune école ne dispose de ces kits a l'heure actuelle. Les participants à l'atelier ont plaidé pour que, dans le contexte d'une reprise de l'épidémie de la COVID-19 en RCA, les partenaires relancent ce type d'activité.</p>			
OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales.</p> <p>Quantité</p> <p>15 km (10 km pour les Route nationale 2 et Route rurale 17,5 km en voies urbaines).</p>			<p>Directrice régionale du Plan</p> <p>Direction régionale des Transports</p>






Améliorer l'éclairage public et de l'accès à l'énergie

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Installer des lampadaires solaires en nombre suffisant (au moins 300).</p> <p>Quantité</p> <p>100 par arrondissement.</p>	<p>PACAD/UNOPS : 60 lampadaires installés (dont 3 pour lesquels la batterie a été pillée).</p> <p>OIM : 9 lampadaires installés (dont certains vandalisés en janvier 2021).</p>		<p>Direction régionale de l'Energie et hydraulique</p> <p>Direction régionale du Plan</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>La crise de janvier 2021 a entraîné des actes de vandalisme. Au total, 54 lampadaires sont fonctionnels dans la commune de Bangassou.</p>			

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Réhabilitation de la Centrale thermique de Bangassou et installations connexes.</p> <p>Quantité</p> <p>Groupe électrogène et accessoires.</p>			<p>Préfecture</p> <p>Sous-Préfecture</p> <p>Mairie</p> <p>Direction régionale de l'Energie et hydraulique</p>







Renforcer le plateau technique de santé dans la commune

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Extension et équipement du centre de santé de Bangui-Ville et Maliko.</p> <p>Quantité</p> <p>300 m² par centre de santé.</p>	<p>CORDAID :</p> <p>Réhabilitation des centres de santé de Maliko, Bangui-ville et Niakaria privé.</p>		<p>Direction régionale de la Santé</p>
<p>Projet</p> <p>Construction et équipement du centre de santé de Tokoyo.</p> <p>Quantité</p> <p>500 m² de locaux et annexes.</p>			<p>Direction régionale de la Santé</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Si aucune réponse en termes de construction n'a été apportée à ce jour, le centre de santé de Tokoyo a bénéficié de dotations de médicaments (CORDAID et OMS), panneaux solaires et matelas (CORDAID), ainsi que de la construction de hangars dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 (HI).</p> <p>CORDAID mène également en 2021 un projet d'appui à 28 formations sanitaires dont 6 dans le centre-ville de Bangassou.</p>			






Renforcer le plateau technique de santé dans la commune (suite)

<p>OBJECTIFS DU PDL</p>	<p>RÉPONSE À CE JOUR</p>	<p>RÉPONSE PLANIFIÉE</p>	<p>ACTEURS À MOBILISER</p>
<p>Projet</p> <p>Recrutement de personnels qualifiés selon les besoins.</p> <p>Quantité</p> <p>Selon les décisions du ministère de la Santé.</p>			<p>Les autorités locales ont souligné que l'affectation et l'arrivée sur zone des fonctionnaires étaient de la responsabilité de l'administration centrale et des fonctionnaires eux-mêmes.</p>
<p>OBJECTIFS DU PDL</p>	<p>RÉPONSE À CE JOUR</p>	<p>RÉPONSE PLANIFIÉE</p>	<p>ACTEURS À MOBILISER</p>
<p>Projet</p> <p>Dotation du Centre de Santé de Cesacoba en réfrigérateur pour la conservation des vaccins.</p> <p>Quantité</p> <p>1 réfrigérateur double compartiments.</p>			<p>Direction régionale de la Santé</p>





Lutter contre les effectifs pléthoriques dans les salles de classe

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Réhabilitation et équipement des anciennes salles de classes.</p> <p>Quantité</p> <p>Dépenser 12 millions XAF par école soit 6 millions par module.</p>			<p>Inspection académique du Sud-Est</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Aucune activité ne semble en cours ou prévue en centre-ville. COOPI a lancé en avril 2021 un projet de 15 mois pour des activités de réhabilitation, d'équipement et de dotation de kits didactiques dans 6 localités sur les axes Bakouma et Rafaï.</p>			
OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Construction et équipement de 40 salles de classes avec annexes pour combler le déficit.</p> <p>Quantité</p> <p>10 modules de 4 salles de classe.</p>	<p>MINUSCA : Construction d'une école dans le 3^e arrondissement.</p>		<p>Inspection académique du Sud-Est</p>







Lutter contre les effectifs pléthoriques dans les salles de classe (suite)

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Construction et équipement de deux collèges d'enseignement général de 12 classes.</p> <p>Quantité</p> <p>Modules de 3 salles de classe.</p>	<p>PACAD/UNOPS :</p> <p>Construction d'un collège en cours dans le quartier Sayo (1^{er} arrondissement).</p>		<p>Inspection académique du Sud-Est</p>
<p>Projet</p> <p>Recrutement d'enseignants qualifiés selon les besoins.</p> <p>Quantité</p> <p>Selon les décisions du ministère de l'Education.</p>	<p>Le ministère de l'Education a affecté 109 enseignants qualifiés (53 niveau F1 et 56 niveau F2) pour les préfectures du Mbomou, Haut-Mbomou et Basse-Kotto. La répartition n'a pas encore été faite, le processus est en cours.</p>		<p>Inspection académique du Sud-Est</p>






Améliorer l'alphabétisation et la formation technique et professionnelle

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Construction et équipement d'un centre de formation technique et professionnelle.</p> <p>Quantité</p> <p>3 modules de 4 salles de classe.</p>			<p>Inspection académique du Sud-Est</p>
OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Construction et équipement d'un centre d'alphabétisation fonctionnelle intensive (AFI).</p> <p>Quantité</p> <p>1 module de 3 salles de classe.</p>			<p>Inspection académique du Sud-Est</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Dans le cadre du projet RELSUDE, l'ONG OXFAM doit mener des activités d'AFI à destination des femmes notamment, et créer un comité d'alphabétisation.</p>			



Renforcer les capacités et améliorer les rendements scolaires

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Création des cantines scolaires dans toutes les écoles.</p> <p>Quantité</p> <p>A voir avec le ministère des Affaires sociales.</p>	<p>PAM/EPHPHATHA :</p> <p>Approvisionnement des cantines scolaires. Cette approvisionnement a été ralenti du fait de problèmes logistiques liés à la crise de janvier 2021.</p>		<p>Inspection académique du Sud-Est</p> <p>Direction régionale des Affaires sociales</p>
<p>Projet</p> <p>Dotations des chefs de secteurs en moyens roulants.</p> <p>Quantité</p> <p>A voir avec le ministère de l'Éducation.</p>			<p>Inspection académique du Sud-Est</p>
	<p>COMMENTAIRE</p> <p>Le plaidoyer auprès des ONG pourrait se faire au niveau de Bangui, par les services du ministère.</p>		






Désenclaver la région n°6 et faciliter l'accès à Bangassou

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Aménagement et réhabilitation de la route RR 17 et des pistes rurales intercommunales.</p> <p>Quantité</p> <p>Réhabilitation en graveleux latéritique</p>	<p>Projet LONDO : Aménagement de 5 km la RR17</p> <p>MINUSCA : Aménagement de la RR17</p>		<p>Mairie</p> <p>Direction régionale du Plan</p> <p>Direction régionale des Travaux publics</p>







Assurer une meilleure mobilité urbaine



OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Bitumage des sections des routes principales RR 17 et RN 2 au centre-ville de Bangassou 5 km.</p> <p>Quantité</p> <p>15 km de voies urbaines au centre-ville (RN2 et RR17) avec caniveaux.</p>			<p>Mairie</p> <p>Direction régionale du Plan</p> <p>Direction régionale des Travaux publics</p>
<p>Projet</p> <p>Réhabilitation de rues et d'ouvrages d'art.</p> <p>Quantité</p> <p>Voies secondaires en latérite avec fossés et franchissements.</p>	<p>ACTED : Réhabilitation d'un pont dans le 3e arrondissement.</p> <p>OIM Réhabilitation de deux ponts en béton armé dans les 1^{er} et 2^e arrondissements.</p> <p>1 pont a été réhabilité par un particulier.</p>		<p>Mairie</p> <p>Direction régionale du Plan</p> <p>Direction régionale des Travaux publics</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Les réhabilitations n'ont pas toutes donné satisfaction car les matériaux sont parfois jugés peu durables. Les services techniques doivent être plus impliqués dans la mise en œuvre de ces activités.</p>			



Promouvoir l'économie



OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Recensement et rénovation/reconstruction des boutiques détruites lors de la crise.</p> <p>Quantité</p> <p>Une vingtaine de boutiques.</p>			<p>Mairie</p> <p>Direction régionale du Plan</p> <p>Direction régionale des Travaux publics</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Les rénovations/constructions doivent concerner des boutiques appartenant à la mairie, et non des boutiques privées, pour que leur activité bénéficie au budget de la commune.</p>			

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Aménagement et assainissement du marché principal (Phase 1).</p> <p>Quantité</p> <p>Réhabilitation complète.</p>			<p>Mairie</p> <p>Direction régionale du Commerce</p>

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Aménagement et assainissement des trois marchés secondaires (phase 2).</p>			<p>Mairie</p> <p>Direction régionale du Commerce</p>





Promouvoir l'économie (suite)

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Réhabilitation/rénovation et équipement des bâtiments administratifs.</p> <p>Quantité</p> <p>Une douzaine de bâtiments.</p>	<p>OXFAM (RELSUDE) :</p> <p>Mise en place d'un comité de ciblage.</p>	<p>OXFAM (RELSUDE) :</p> <p>Réhabilitation/rénovation et équipement des bâtiments administratifs sur les orientations du comité.</p>	<p>Préfecture</p> <p>Sous-Préfecture</p> <p>Mairie</p>
<p>Projet</p> <p>Construction et équipement d'un Commissariat de police à Tokoyo.</p> <p>Quantité</p> <p>300 m² de bureaux et annexes.</p>			<p>Préfecture</p> <p>Sous-Préfecture</p> <p>Mairie</p> <p>Direction régionale de la Police</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>La MINUSCA Affaires civiles soutient actuellement la construction de la Direction régionale de la Police.</p>			









Organiser les producteurs en groupements et associations bien structurés

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Création et accompagnement des groupements.</p> <p>Quantité</p> <p>Cinq groupements de producteurs.</p>	<p>OXFAM (RELSUDE) : Accompagnement de 70 groupements pour la culture maraichère.</p> <p>EPHPHATHA : Accompagnement de 30 groupements.</p> <p>Finn Church Aid Phase d'identification de 15 groupements bénéficiaires dans le 3^e arrondissement.</p>	<p>OXFAM (RELSUDE) : Accompagnement de 180 groupements supplémentaires (250 au total).</p> <p>CORDAID : Accompagnement de groupements (en phase d'identification)</p> <p>Finn Church Aid : Appui en intrant, encadrement technique pour la culture vivrière, AGR.</p>	<p>Direction régionale de l'Agriculture</p> <p>Direction régionale de l'ACDA</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>La création de groupement prévue par le PDL ne s'avère plus vraiment pertinente. En revanche, l'appui aux groupements existants en termes de formation aux techniques culturales et de structuration administrative et réglementaire est à privilégier.</p>			

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Promotion de la diversification agricole.</p> <p>Quantité</p> <p>Experts et agents d'agriculture avec moyens matériels d'expérimentation.</p>			<p>Direction régionale de l'Agriculture</p> <p>Direction régionale de l'ACDA</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Bien que des projets en cours promeuvent la diversité agricole, ils ne semblent pas prévoir directement l'appui d'experts et d'agents agricoles.</p>			







Appuyer la commune en variétés à cycle court

<p>OBJECTIFS DU PDL</p> <p>Projet</p> <p>Appui à l'utilisation des semences améliorées (maïs, arachide, etc)</p> <p>Quantité</p> <p>Experts et agents d'agriculture avec moyens matériels d'expérimentation</p>	<p>RÉPONSE À CE JOUR</p> 	<p>RÉPONSE PLANIFIÉE</p> 	<p>ACTEURS À MOBILISER</p> <p>Direction régionale de l'Agriculture</p> <p>Direction régionale de l'ACDA</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>OXFAM a commencé un projet autour des semences améliorées, mais celui-ci ne prévoit pas l'appui d'experts ou d'agents d'agriculture.</p>			
<p>OBJECTIFS DU PDL</p> <p>Projet</p> <p>Introduction du manioc à cycle court</p> <p>Quantité</p> <p>Experts et agents d'agriculture avec moyens matériels d'expérimentation</p>	<p>RÉPONSE À CE JOUR</p> 	<p>RÉPONSE PLANIFIÉE</p> 	<p>ACTEURS À MOBILISER</p> <p>Direction régionale de l'Agriculture</p> <p>Direction régionale de l'ACDA</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Le projet Chinko prévoit de mener des activités autour des semences de manioc (distribution de boutures de manioc à cycle court). L'appui d'experts et d'agents d'agriculture n'est pas prévu.</p>			
<p>OBJECTIFS DU PDL</p> <p>Projet</p> <p>Redynamisation des cultures de rente (café, coton)</p> <p>Quantité</p> <p>Experts et agents d'agriculture avec moyens matériels d'expérimentation</p>	<p>RÉPONSE À CE JOUR</p> 	<p>RÉPONSE PLANIFIÉE</p> 	<p>ACTEURS À MOBILISER</p> <p>Direction régionale de l'Agriculture</p> <p>Direction régionale de l'ACDA</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Les participants ont fait remarquer que la culture du coton ne se pratiquait pas localement et qu'il convenait de modifier cet objectif en remplaçant le coton par le cacao.</p>			






Désenclaver les zones de production

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Réhabilitation des pistes intercommunales.</p> <p>Quantité</p> <p>Pistes desservant les communes limitrophes en latérite.</p>			<p>Préfecture</p> <p>Sous-Préfecture</p> <p>Mairie</p> <p>Direction régionale des Transports et de l'équipement</p>
<p>Projet</p> <p>Construction des routes régionales et nationales.</p> <p>Quantité</p> <p>A déterminer avec le ministère des Travaux publics et de l'équipement.</p>			<p>Préfecture</p> <p>Direction régionale des Transports et de l'équipement</p>





Pacifier la transhumance par une meilleure gestion

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Sensibilisation des éleveurs et des agriculteurs sur leur complémentarité.</p> <p>Quantité</p> <p>3 séances de sensibilisation.</p>	<p>FCA : Formation de 3 jours.</p>		<p>Direction régionale de l'Elevage</p> <p>Direction régionale de l'Agriculture</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Les participants ont estimé qu'il fallait davantage de séances de sensibilisation.</p>			
OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Mise en place d'un Comité de gestion des couloirs de transhumance.</p> <p>Quantité</p> <p>Dotation de fonctionnement 3 ans.</p>			<p>Direction régionale de l'Agriculture</p> <p>Direction régionale de l'Elevage</p> <p>Mairie, Préfecture, Sous-préfecture</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>Certains participants insistaient sur la nécessité de définir officiellement le tracé d'un couloir de transhumance en amont de la mise en place du comité, ou que cela soit sa première tâche.</p>			





Renforcer l'encadrement des éleveurs et accroître la production pastorale

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Dotation du service d'élevage en produits vétérinaires.</p> <p>Quantité</p> <p>Forfait de dotation à vendre et à réapprovisionner.</p>		<p>ACTED :</p> <p>Projet envisagé de construction d'une pharmacie vétérinaire avec dotation en produits vétérinaires.</p>	<p>Direction régionale de l'Elevage</p> <p>Chef secteur ANDE</p>
<p>Projet</p> <p>Soutien à la reprise des activités de l'ACDA.</p> <p>Quantité</p> <p>Dotation de fonctionnement.</p>		<p>AGORA (RELSUDE) :</p> <p>Dotations de fournitures de bureau et formations.</p>	<p>Direction régionale de l'ACDA</p>




ACTIVITÉS AGRO-PASTORALES

Soutenir la transformation des produits agricoles

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Soutenir la transformation des produits agricoles.</p> <p>Quantité</p> <p>Fonds de soutien à la transformation.</p>			<p>Direction régionale de l'Agriculture</p> <p>Direction régionale du Commerce</p>


ACTIVITÉS AGRO-PASTORALES

Renforcer les capacités des artisans

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Renforcer les capacités des artisans.</p> <p>Quantité</p> <p>Fonds de soutien aux artisans.</p>			<p>Direction régionale de l'Agriculture</p> <p>Direction régionale du Commerce</p>




Développer la production piscicole

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Encadrement des pisciculteurs.</p> <p>Quantité</p> <p>Agents d'encadrement et matériels.</p>	<p>Projet Chinko : Formation des pêcheurs.</p>	<p>OXFAM (RELSUDE) : Soutien aux activités piscicoles.</p>	<p>Direction régionale de l'Elevage</p>
<p>Projet</p> <p>Dotations des pisciculteurs en alevins.</p> <p>Quantité</p> <p>Fonds de soutien à la pisciculture.</p>		<p>OXFAM (RELSUDE) : Dotations envisageables.</p>	<p>Direction régionale de l'Elevage</p>



Améliorer la situation carcérale

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Réhabilitation/Construction et équipement d'une nouvelle maison d'arrêt de Bangassou (répondant aux normes) avec logements de fonction.</p> <p>Quantité</p> <p>1000 m² y compris administration, logements et annexes.</p>	<p>MINUSCA :</p> <p>Réhabilitation de la maison d'arrêt et construction d'une annexe (mis en œuvre par OEVCA - Orphelins et Enfants Vulnérables de Centrafrique).</p>		<p>Direction régionale de la Justice</p> <p>Direction régionale de la Police</p>



Renforcer la justice et l'Etat de droit

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Renforcement des capacités des officiers de police judiciaire.</p> <p>Quantité</p> <p>Formation et moyens de travail.</p>			<p>Direction régionale de la Justice</p> <p>Direction régionale de la Police</p>
<p>Projet</p> <p>Recrutement du personnel judiciaire.</p> <p>Quantité</p> <p>Voir avec le ministère de la Justice.</p>			<p>Direction régionale de la Justice</p> <p>Direction régionale de la Police</p>
<p>Projet</p> <p>Sensibilisation des populations sur les actes attentatoires à l'Etat de droit et les droits et devoirs du citoyen.</p> <p>Quantité</p> <p>3 séances par arrondissement.</p>			<p>Direction régionale de la Justice</p> <p>Direction régionale de la Police</p>





Renforcer le dispositif sécuritaire

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Construction et équipement de commissariats de police à Maliko (phase 2).</p> <p>Quantité</p> <p>300 m² construits avec annexes.</p>			<p>Direction régionale de la Police</p> <p>Préfecture, Sous-préfecture, Mairie</p>
<p>COMMENTAIRE</p> <p>La construction d'un commissariat de police à Maliko est prévue en phase 1. La MINUSCA Affaires civiles soutient actuellement la construction de la Direction régionale de la Police.</p>			
OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Construction d'un poste de contrôle frontalier (police – eaux et forêts – phytosanitaire) à la frontière fluviale avec la RDC.</p> <p>Quantité</p> <p>60 m² construit et annexes.</p>			<p>Direction régionale de la Police</p> <p>Préfecture, Sous-préfecture, Mairie</p>



Améliorer la communication sociale

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Reconstruction et équipement du bâtiment de la radio communautaire.</p> <p>Quantité</p> <p>150 m² avec équipements.</p>	<p>PNUD/MINUSCA/RMCC :</p> <p>Réhabilitation en cours de la Radio Mbari</p>		<p>Mairie</p> <p>Société civile</p>
<p>Projet</p> <p>Formation des journalistes et des animateurs communautaires.</p> <p>Quantité</p> <p>3 sessions de formation.</p>		<p>RMCC :</p> <p>Formation à venir dès que la Radio Mbari sera réhabilitée.</p> <p>OXFAM (RELSUDE) :</p> <p>Appui, conseil et accompagnement auprès de la société civile.</p>	<p>Mairie</p> <p>Société civile</p>




Amélioration de la gouvernance concertée

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Mise en place de la plateforme de communication entre les acteurs locaux (Humanitaires – opérateurs économiques – État – Communautés).</p> <p>Quantité</p> <p>2 séances de travail.</p>			<p>Autorités locales</p> <p>Société civile</p> <p>Partenaires technique et financier</p>
<p>Projet</p> <p>Fonctionnement du comité de suivi du PDL.</p> <p>Quantité</p> <p>2 sessions par an sur 3 ans.</p>	<p>AGORA (RELSUDE) : Atelier de suivi du PDL le 31 mars 2021.</p>	<p>Prochain atelier à venir en novembre-décembre 2021.</p>	<p>Membres du comité technique de suivi</p>
<p>Projet</p> <p>Mise en place d'un cadre de concertation entre les acteurs État – Société Civile – Partenaires Techniques et Financiers.</p> <p>Quantité</p> <p>2 séances de travail.</p>		<p>OXFAM/AGORA (RELSUDE) : Appui ou la mise en place d'une plateforme de coordination.</p>	<p>Autorités locales</p> <p>Société civile</p> <p>Partenaires techniques et financiers</p>



Retour de l'Administration

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Redéploiement des agents de l'Etat dans les différents services.</p> <p>Quantité</p> <p>A voir avec le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD).</p>	<p>MATD : Redéploiement en cours.</p>		<p>Préfecture</p> <p>Sous-préfecture</p> <p>Mairie</p>
<p>Projet</p> <p>Renforcement des capacités des Agents de l'Etat.</p> <p>Quantité</p> <p>9 séances de formation (3 par an).</p>	<p>MINUSCA Affaires civiles : Formations sur la déontologie professionnelle.</p>	<p>AGORA (RELSUDE) : Formations des autorités locales et des services techniques (été-automne 2021).</p> <p>OXFAM (RELSUDE) : Appui conseil et accompagnement des autorités locales.</p>	<p>Préfecture</p> <p>Sous-préfecture</p> <p>Mairie</p>



Protéger les couches vulnérables et favoriser l'inclusion sociale

OBJECTIFS DU PDL	RÉPONSE À CE JOUR	RÉPONSE PLANIFIÉE	ACTEURS À MOBILISER
<p>Projet</p> <p>Construction et équipement d'une maison des jeunes</p> <p>Quantité</p> <p>200 m² de salle avec bureau et annexes</p>	<p>UNOPS/PACAD :</p> <p>Construction en cours</p>	<p>OXFAM (RELSUDE) :</p> <p>Petites dotations en kits prévues</p>	<p>Mairie</p>

